


12. Plano de implementação com prazos

12.1 Cronograma

O cronograma abaixo é uma revisão das atividades da linha de trabalho 1 do CCWG-Responsabilidade.




[Cronograma](#) completo de transição da administração da IANA e aprimoramento da responsabilidade da ICANN:

O cronograma a seguir concentra-se predominantemente na linha de trabalho 1 e em sua respectiva implementação. A linha de trabalho 2 permanecerá na forma básica até que haja mais clareza sobre quais mecanismos de responsabilidade vão compor seu escopo.

A versão completa deste cronograma pode ser encontrada na [wiki do CCWG-Responsabilidade](#).

CCWG Timeline – 17 July 2015

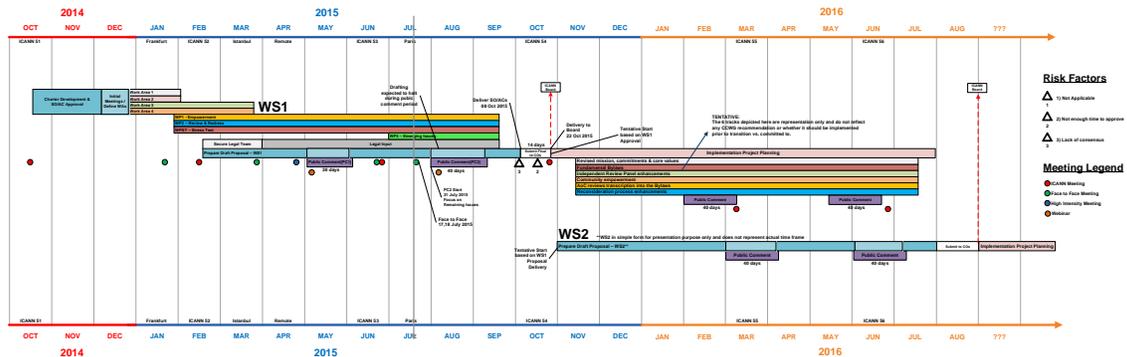

12.2 Próximas etapas

- O segundo relatório de comentários públicos especifica a proposta do CCWG-Responsabilidade depois de receber a primeira rodada de comentários públicos, considerar essas opiniões e interagir com a comunidade durante o ICANN 53. Após o encerramento do segundo período de comentários públicos, o CCWG-Responsabilidade se reunirá novamente para finalizar a(s) proposta(s) da linha de trabalho 1 e enviá-la(s) às organizações regulamentadoras e, finalmente, à diretoria da ICANN. Os pontos principais incluem:
- O CCWG-Responsabilidade analisa a segunda rodada de comentários públicos e refina sua proposta para preparar a versão final.
- O CCWG-Responsabilidade entrega a proposta final aos SOs/ACs para aprovação.
- O CCWG-Responsabilidade finaliza as especificações para as alterações ao estatuto da ICANN.
- O CCWG-Responsabilidade prepara materiais para o 54º encontro da ICANN e apresenta diversas sessões para dar mais informações à comunidade sobre a proposta final.
- O CCWG-Responsabilidade entrega a proposta final à diretoria da ICANN.
- O CCWG-Responsabilidade verifica se as alterações ao estatuto são consistentes com as propostas da linha de trabalho 1.
- O CCWG-Responsabilidade começa a supervisão da implementação dos itens da linha de trabalho 1 que não são alterações ao estatuto e começa seu trabalho na linha de trabalho 2.

12.3 Implementação

O CCWG-Responsabilidade considera a supervisão da implementação da linha de trabalho 1 um elemento crucial para sua empreitada. As alterações na responsabilidade da linha de trabalho 1 devem ser implementadas ou adotadas antes que ocorra a transição de administração da IANA da NTIA. O CCWG-Responsabilidade estima que a implementação leve aproximadamente nove meses, com várias linhas simultâneas, algumas das quais exigirão vários períodos de comentários públicos. O CCWG-Responsabilidade delineou provisoriamente os seis caminhos a seguir para a implementação da linha de trabalho 1:

- Revisar missão, compromissos e valores essenciais.
- Estabelecer o estatuto fundamental.
- Concluir os aprimoramentos do painel de revisão independente.
- Estabelecer um mecanismo de empoderamento da comunidade e incorporação dos poderes da comunidade ao estatuto.
- Implementar as revisões da Ratificação de compromissos no estatuto.
- Concluir os aprimoramentos do processo de reconsideração.

Um número significativo de recomendações da linha de trabalho 1 do CCWG-Responsabilidade envolve a atualização do Estatuto da ICANN. O cronograma ideal para a implementação é apresentado abaixo. Na verdade, além dos aprimoramentos do IRP, a maior parte das recomendações da linha de trabalho 1 será implementada durante a atualização do estatuto da ICANN.

O CCWG-Responsabilidade iniciou um processo para começar a redação das alterações do estatuto e implementar suas propostas. Isso será feito para atender à expectativa do congresso dos Estados Unidos de que o conjunto de alterações no estatuto necessárias para a transição seja adotado antes da aceitação da proposta de transição pela IANA. Atualmente, esse processo está em andamento e a redação do estatuto foi iniciada em relação às partes da proposta que tiveram amplo apoio durante o primeiro período de comentários públicos:

- Incorporar as revisões da AoC no estatuto
- Dependências do CWG-Administração, conforme apropriado

O CCWG-Responsabilidade espera entregar um conjunto de alterações ao estatuto a tempo para sua aprovação pela diretoria da ICANN em meados de novembro de 2015.

A implementação dos aprimoramentos do IRP além das alterações relevantes ao estatuto incluirá:

- Seleção de panelistas
- Estabelecimento da secretaria do painel
- Definição das normas de procedimento

O CCWG-Responsabilidade espera que esse processo seja realizado durante um período de nove meses e que seja concluído até julho de 2016.

12.4 Processo de redação do estatuto

O processo de redação do estatuto foi desenvolvido depois de discussões com a comunidade da ICANN no encontro ICANN 53 em Buenos Aires, considerando os comentários da diretoria e da equipe jurídica da ICANN para encontrar um denominador comum com os requisitos do CCWG-Responsabilidade e identificar um processo aceitável e apropriado.

Requisitos

De acordo com os métodos de trabalho do CCWG-Responsabilidade, o processo para a redação do estatuto se baseia no conceito de requisitos:

- Todas as decisões finais sobre o estatuto propostas à diretoria da ICANN seriam aprovadas pelo CCWG-Responsabilidade e/ou um de seus subgrupos responsáveis.
- As decisões do CCWG-Responsabilidade e de seus subgrupos seria informada através de pareceres jurídicos independentes.
- A equipe jurídica da ICANN faz recomendações à diretoria da ICANN.

- O processo de redação será um trabalho colaborativo entre o CCWG-Responsabilidade e seus subgrupos, a equipe jurídica da ICANN e a consultoria jurídica independente do CCWG-Responsabilidade. Esse trabalho colaborativo será baseado em especificações derivadas dos períodos de comentários públicos e de outras recomendações recebidas.

Processo de redação do estatuto

1. As especificações para a revisão do estatuto serão desenvolvidas com base na proposta do CCWG-Responsabilidade após o primeiro período de comentários públicos e outras contribuições recebidas, especialmente durante as consultas realizadas durante o ICANN53 em Buenos Aires. A especificação será aprovada pelo subgrupo adequado do CCWG-Responsabilidade, considerando todas as recomendações fornecidas pela equipe jurídica da ICANN e por uma consultoria jurídica independente.
2. O CCWG-Responsabilidade será responsável por aprovar a especificação e iniciar o processo de redação do estatuto. Observação: a especificação pode ser apresentada no formato de rascunhos para o estatuto.
3. A redação inicial e o ajuste do estatuto com base na especificação serão feitos pela equipe jurídica da ICANN, em colaboração com uma consultoria jurídica independente.
4. Revisão da versão inicial: o subgrupo adequado do CCWG-Responsabilidade, com apoio da equipe jurídica da ICANN e de uma consultoria jurídica independente, analisará o texto para garantir que ele atenda às especificações e o objetivo do CCWG-Responsabilidade. O subgrupo do CCWG-Responsabilidade será responsável por aprovar a revisão independente.
5. Uma revisão independente será realizada pela consultoria jurídica independente do CCWG-Responsabilidade (ou também pela equipe jurídica da ICANN), a fim de avaliar a conformidade com a especificação e garantir a ausência de consequências não planejadas.
6. O subgrupo do CCWG-Responsabilidade analisará as recomendações da revisão independente e fará ajustes conforme necessário. O texto preliminar do estatuto e as recomendações serão compartilhados com o CCWG-Responsabilidade e com a diretoria da ICANN.
7. Todos os membros e participantes do CCWG-Responsabilidade serão responsáveis por tomar decisões em relação a conflitos de interpretação, e também por aprovar a alteração do estatuto para incluir uma proposta de que o texto preliminar seja apresentado para comentários públicos. Caso haja um conflito de interpretação, o CCWG-Responsabilidade enviará o texto preliminar do estatuto de volta a seu subgrupo e às equipes jurídicas para ajustes.

O processo de aprovação final do estatuto desenvolvido através desse processo usaria os métodos da diretoria e da comunidade da ICANN.
