


12. 实施规划和时间安排

12.1 时间表

以下时间表用于审核加强 ICANN 问责制跨社群工作组工作阶段 1 的工作。




IANA 管理权完全移交和 ICANN 问责制强化的[时间表](#)。

后续的时间表主要关注工作阶段 1 及其相应的实施情况。对问责制将构成的范围进行更多说明之前，工作方向 2 会保持基本形式。

有关此时间表的完整版本，请参阅 [加强 ICANN 问责制跨社群工作组 Wiki](#)。

CCWG Timeline – 17 July 2015

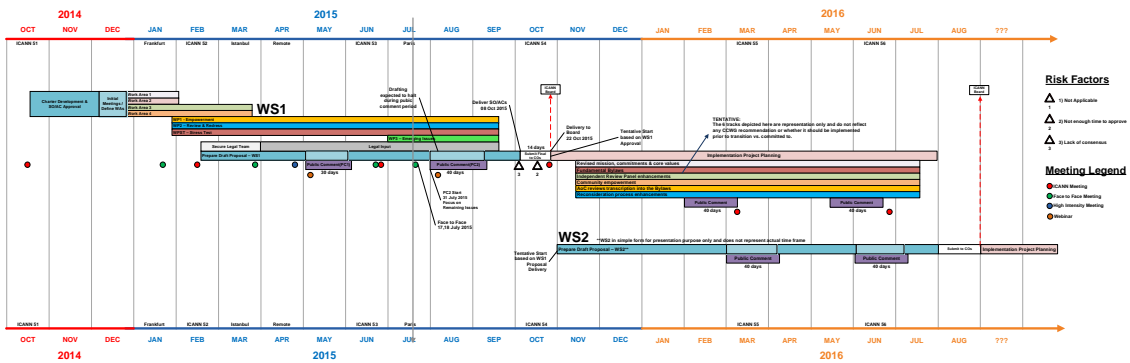

12.2 后续步骤

- 第二份公开评议报告是在收到第一轮公开评议后完成的，考虑到了这些评议意见以及在 ICANN 53 会议期间收集的社群意见，因此这反映了 CCWG-Accountability 对相关事项的提案。第二个公开评议期结束后，CCWG-Accountability 将重新启动以完成工作阶段 1 提案，该提案会提交给章程组织，并最终提交给 ICANN 董事会。关键里程碑包括：
- CCWG-Accountability 审核第二轮公开评议并完善其提案，从而为最终版本做准备。

- CCWG-Accountability 将最终提案交给 SO/AC 审批。
- 最后由 CCWG-Accountability 对 ICANN 章程的变更进行详述。
- CCWG-Accountability 将为 ICANN 54 准备相关材料，并主办多场会议，进一步告知社群最终提案的情况。
- CCWG-Accountability 将最终提案交给 ICANN 董事会。
- CCWG-Accountability 确认章程的更改符合其工作阶段 1 提案的要求。
- CCWG-Accountability 将开始实施对不属于章程变更的工作阶段 1 项目的监督，并着手工作阶段 2 的工作。

12.3 实施

CCWG-Accountability 将审视对工作阶段 1 的实施情况，这是其使命的关键部分。NTIA 移交 IANA 管理工作后，必须实施并重点关注工作方向 1 问责制变化。CCWG-Accountability 估计，实施将需要大约 9 个月，并且需要多轨齐下，其中一些工作需要多个公开评议期。加强 ICANN 问责制跨社群工作组已暂时为实施工作方向 1 规划了以下六次跟踪：

- 修改使命、义务及核心价值。
- 制定基本章程。
- 完成独立审核小组的强化。
- 建立社群赋权机制，将社群权力纳入章程之中。
- 将《义务确认书》审核意见实施到章程之中。
- 完成重审流程强化。

大部分的 CCWG-Accountability 工作阶段 1 建议都涉及到 ICANN 章程的更新。可以在以下内容中找到最佳实施时间安排。事实上，除 IRP 强化之外，大多数的建议都需要通过更新 ICANN 章程来实施。

CCWG-Accountability 已启动了一项流程来开始草拟章程变更以实施其提案。这样做符合美国国会的预期，即进行移交所需的章程更改应在 NTIA 确认移交提案之前完成。目前正在实施该流程，并已针对提案中第一次公开评议期间受到广泛支持的以下部分开始章程的草拟工作：

- 将 AOC 审核纳入章程
- 相应的 CWG-Stewardship 依存关系

由于此流程十分快捷，CCWG-Accountability 预计能够及时完成一系列的章程变更，这样 ICANN 董事会就能在 2015 年 11 月中对其进行审批了。

IRP 强化在相关章程变更之外，其实施措施将包括：

- 选择小组成员
- 为小组成立秘书处

- 定义流程规则

CCWG-Accountability 预计这将在 9 个月的期限内完成，即应在 2016 年 7 月完成。

12.4 章程草拟流程

章程草拟流程是在布宜诺斯艾利斯的 ICANN53 会议上与 ICANN 社群讨论之后制定的，考虑了 ICANN 董事会和 ICANN 法律人员的意见，根据 CCWG-Accountability 要求找到共同之处，来确定一个可接受的恰当流程。

要求

在与 CCWG-Accountability 的工作方法保持一致的情况下，章程草拟流程取决于对以下要求的解读：

- 任何有关章程的最终决策在提交给 ICANN 董事会后，都需要获得 CCWG-Accountability 和/或相关的 CCWG-Accountability 小组的批准。
- CCWG-Accountability 及其小组的决策将通过独立法律建议的方式进行传达。
- ICANN 法律人员负责向 ICANN 董事会提供法律建议。
- 草拟流程需要 CCWG-Accountability 及其小组、ICANN 法律人员以及 CCWG-Accountability 的独立法律顾问的通力协作。该协作的基础是第一个公开评议提案、后续的公开评议以及其他收到的建议的详细内容。

章程草拟流程

1. 修订版章程的细则将根据 CCWG-Accountability 的首个公开评议提案以及接收到的公开评议意见和其他意见（尤其是在 ICANN53 布宜诺斯艾利斯会议期间进行协商时收到的意见）修正的修正版提案制定。细则将由相关的 CCWG-Accountability 小组进行审核，在审核过程中会考虑 ICANN 法律人员和独立法律顾问提供的建议。
2. CCWG-Accountability 将负责审核该细则并启动章程草拟流程。注意：细则可能会以章程草案的形式发布。
3. 初始的章程草拟工作以及在细则的基础上进行细化的工作将由 ICANN 法律人员承担，在此过程中会与独立法律顾问进行合作。
4. 初始草案审核：受 ICANN 法律人员和独立法律顾问支持的相关 CCWG-Accountability 小组将对草案进行审核，确保其符合细则以及 CCWG-Accountability 的预期。CCWG-Accountability 小组将负责对独立审核意见进行审批。
5. 独立审核将由 CCWG-Accountability 的独立法律顾问来完成（ICANN 法律人员也可能会参与审核），在审核过程中将评估草案是否符合细则，确保其中不包含与预想冲突的内容。
6. CCWG-Accountability 小组将审核独立审核意见，并根据需要对内容做以调整。章程草案和意见将通报加强 CCWG-Accountability 和 ICANN 董事会。

7. 全体 CCWG-Accountability 成员和参与者将负责确定某项内容的解释是否存在冲突，并负责审批需要纳入提案（提案的内容是草案需进行公开评议）中的章程变更。或者，在对某项内容的解释存在冲突的情况下，CCWG-Accountability 总组会将章程草案退回 CCWG-Accountability 小组和法律团队进行进一步的细化。

通过这一流程制定的章程的最终批准流程将采用 ICANN 董事会和 ICANN 社群的流程。
