


## المحلق H - عملية صياغة اللوائح الداخلية والجدول الزمني للتنفيذ

- 1 تنظر مجموعة CCWG-Accountability الى تنفيذ الإشراف على مسار العمل 1 باعتباره عنصراً أساسياً من تفويضها. ويجب تنفيذ تغييرات المساءلة لمسار العمل 1 أو الإلتزام بها قبل أن تتم عملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA. تم تنسيق جهود التنفيذ من خلال ICANN، ومع العديد من المسارات المتزامنة، والتي سيتطلب البعض منها عدة فترات للتعليقات العامة.
- 2 تم توضيح خطة التنفيذ لمقترح مجموعة CCWG-Accountability حول توصيات مسار العمل 1، في هذه الفقرة.

### الجدول الزمني

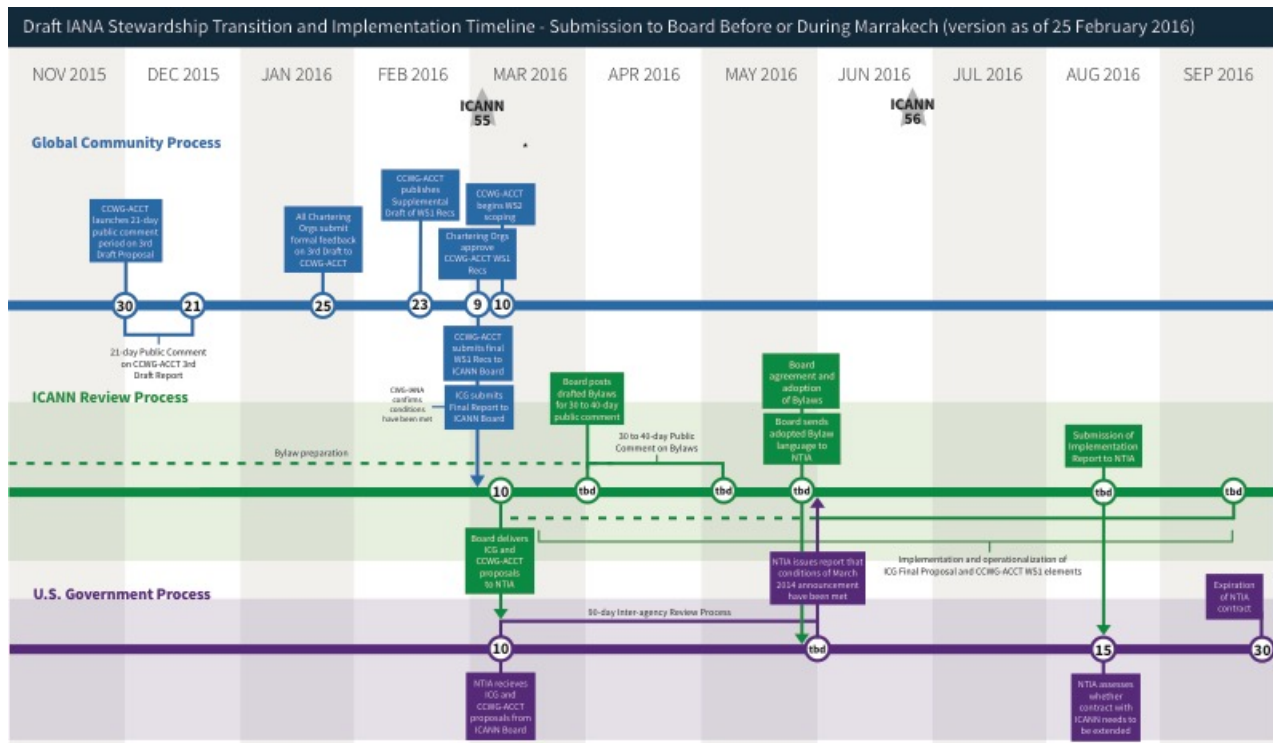

- 3 الجدول الزمني الكامل لعملية إنتقال الإشراف على وظائف IANA وتعزيز مساءلة ICANN متوفر [هنا](#).
- 4 ولضمان التنفيذ في الوقت المناسب، باشرت مجموعة CCWG-Accountability بعملية صياغة اللوائح الداخلية (وبالتنسيق مع ICANN) لدمج متطلباتها وشروطها في اللوائح الداخلية لـ ICANN. وهذا يشمل تضمين مراجعات ملزمة في وثيقة تأكيد الألتزامات AoC ومتعلقات مجموعة CWG-Stewardship كلما كان ذلك مناسباً. وحال إكتمال صياغة مسودة اللوائح الداخلية، فإنه سيتم نشرها لأجل التعليقات العامة. وستتم مصادقة مجلس إدارة ICANN عليها وتبنيها بعد إنتهاء عملية التعليقات العامة وبعد أن تكمل مراجعتها للمقترحات.
- 5 ويتوقع أن تكمل NTIA عملية المراجعة الخاصة بها في فترة تتراوح بين 60-90 يوماً. ويتوقع أن يتم تبني اللوائح الداخلية لـ ICANN مباشرة بعد أن تنتهي NTIA من مراجعتها لها.

## خطة التنفيذ

- 6 يتضمّن عدد كبير من توصيات مسار العمل 1 لمجموعة CCWG-Accountability على تحديث اللوائح الداخلية لـ ICANN. فعدا تعزيزات عملية المراجعة المستقلة ((IRP)،<sup>1</sup> فإنه سيتم تنفيذ معظم توصيات مسار العمل 1 من خلال التغييرات التي ستتم على اللوائح الداخلية لـ ICANN .
- 7 وبالنتيجة، وضعت مجموعة CCWG-Accountability و ICANN عملية صياغة اللوائح الداخلية إستناداً إلى المتطلبات التالية:
  - ستتم المصادقة على كافة القرارات النهائية بخصوص اللوائح الداخلية المقترحة إلى مجلس إدارة ICANN وذلك من قبل مجموعة CCWG-Accountability و / أو المجاميع الفرعية لمجموعة CCWG-Accountability.
  - وسيتم تعزيز قرارات مجموعة CCWG-Accountability وقرارات مجاميعها الفرعية من خلال الإستشارات القانونية الخارجية.
  - يقوم الكادر القانوني لدى ICANN بتقديم الإستشارات القانونية إلى مجلس إدارة ICANN.
  - وستستند عملية الصياغة على الجهود التعاونية فيما بين المستشار القانوني لمجموعة CCWG-Accountability والكادر القانوني لدى ICANN ومجموعة CCWG-Accountability.

## عملية صياغة اللوائح الداخلية

1. وسيتم وضع وثيقة رسمية لمواصفات اللوائح الداخلية المنقحة إستناداً إلى المقترح النهائي لمجموعة CCWG-Accountability.
2. وستكون مجموعة CCWG-Accountability مسؤولة عن تحسين وثيقة المواصفات وعن المباشرة بعملية صياغة اللوائح الداخلية.
3. وستتم عملية الصياغة الأولية للوائح الداخلية وتنقيحها والمعتمدة على وثيقة المواصفات المحددة من قبل الكادر القانوني لدى ICANN وبالتعاون مع المستشار القانوني لمجموعة CCWG-Accountability.
4. ولمراجعة المسودة الأولية، ستقوم المجموعة الفرعية لمجموعة CCWG-Accountability، مدعومةً من قبل كل من الكادر القانوني لدى ICANN والمستشار القانوني لمجموعة CCWG-Accountability بمراجعة المسودة للتأكد من أنها تستوفي ما ورد في وثيقة المواصفات وأهداف المجموعة. وستكون المجاميع الفرعية لمجموعة CCWG-Accountability مسؤولة عن تحسين عملية المراجعة.
5. وسُجّري المستشار القانوني لمجموعة CCWG-Accountability مراجعة لتقييم مدى الإمتثال لوثيقة المواصفات ولضمان تجنب حدوث أية تداعيات غير مرغوب فيها. ويمكن للكادر القانوني لدى ICANN أن يقوم بالمراجعة.
6. وستقوم المجموعة الفرعية لمجموعة CCWG-Accountability بمراجعة الإستشارات القانونية وإجراء تعديلات عليها متى ما أقتضت الضرورة. وسيتم مشاركة مسودة اللوائح الداخلية والمشورات القانونية مع مجموعة CCWG-Accountability ومع مجلس إدارة ICANN.
7. وسيكون كافة أعضاء مجموعة CCWG-Accountability والمشاركين، مسؤولين عن إتخاذ القرار المناسب بخصوص أي تضارب قد يحدث في تفسير ما يصاغ وسيكونون مسؤولين أيضاً عن المصادقة على التغييرات الحاصلة في اللوائح الداخلية لأجل الإنتهاء من وضع المقترح لأجل نشره للتعليقات العامة. وفي حال وجود إختلاف في فهم وتفسير صياغة المسودة، فستقوم مجموعة CCWG-Accountability بأكملها بإعادة مسودة اللوائح الداخلية إلى المجموعة الفرعية لمجموعة CCWG-Accountability والمستشار القانوني لإجراء المزيد من التهذيب والتعديل عليها.
8. لمجلس إدارة ICANN صلاحية الموافقة النهائية على اللوائح الداخلية مستخدماً بذلك العمليات المستندة على مشاركة المجتمع برمته بما في ذلك فترة التعليقات العامة.

<sup>1</sup> وستشمل تعزيزات تشغيل عمليات المراجعة المستقلة IRP فيما عدا التغييرات ذات الصلة باللوائح الداخلية، إختيار أعضاء الهيئة وتشكيل كادر سكرتارية لها وتحديد ضوابط العملية.

